

Приложение 5
к Порядку выдвижения, внесения,
обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их
конкурсного отбора в городском округе -
городе Барнауле Алтайского края


Инициативный проект


N п/п	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Наименование инициативного проекта, указание на территорию города Барнаула или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным решением городской Думы	«Территория здоровья». Границы территории или части территории городского округа – город Барнаул, Алтайский край. Попова 79 – Попова 61/Антонина Петрова 235 – Островского 68д – Энтузиастов – Островского 77.
2.	Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей города Барнаула или его части, на решение которой направлен инициативный проект	В указанных границах территории благополучателей г. Барнаула наблюдается острый дефицит доступности занятий физической культурой, особенно остро данный вопрос стоит в отношении индивидуальных самостоятельных занятий, которые позволяют сделать физическую культуру доступной для жителей микрорайона на безвозмездной основе.
3.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы. Содержание инициативного проекта	Проект направлен на создание на территории МБОУ «Гимназия №123» спортивной площадки для занятий физической культурой различной направленности. Волейбольно-баскетбольная площадка позволит организовать не только индивидуальные, но и командные занятия спортом. Современное покрытие, обновленная материально-техническая база позволят повысить безопасность при занятии спортом. Турниковая зона позволит укрепить опорно-двигательный аппарат и окажет содействие в подготовке благополучателей к успешной сдаче нормативов ГТО.
4.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Установка и запуск спортивной площадки для занятий физическими упражнениями, проведение досуговых, игровых форм занятий физической культурой. Использование площадки жителями микрорайона и обучающимися

		МБОУ «Гимназия №123» по установленному графику.
5.	Количество прямых благополучателей от реализации проекта	2264 жителей микрорайона и участников образовательных отношений МБОУ «Гимназия №123».
6.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	Июль-август 2026 года.
7.	Общая стоимость инициативного проекта (предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта)	4577828,00 рублей (см. приложение к Заявке)
8.	Запрашиваемый объем средств бюджета города (указание на объем средств бюджета города в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта), %	82% от общей стоимости = 3753818,96 рублей - запрашиваемая
9.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта (планируемый объем инициативных платежей), %	18% от общей стоимости = 824009,04 рублей – от физических лиц
10.	Сведения о планируемом имущественном и (или) трудовом участии в реализации инициативного проекта физических лиц, без учета инициативных платежей	Планируется трудовое участие инициативной группы (в составе 10 человек), а также учащихся школы (450 человек) в субботниках (весной, летом, осенью) по подготовке спортивной зоны..
11.	Сведения о планируемом имущественном и (или) трудовом участии в реализации проекта юридических лиц, без учета инициативных платежей	На основании гарантийного письма Юридического лица АНОПС «Добро.Хорошо» от 20.10.2025 планируется трудовое участие группы физических лиц (10 и более), направленное на подготовку и выравнивание грунта, разгрузки и переноса устанавливаемого оборудования. На основании гарантийного письма Юридического лица ООО «Снежка» от 20.10.2025 планируется имущественное участие в размере 10000 рублей. На основании гарантийного письма Юридического лица ООО «АлтайГлавБух» от 01.10.2025 планируется имущественное участие в размере 10000 рублей. На основании гарантийного письма Юридического лица ООО «Агро Индустрия» от 01.10.2025 планируется имущественное участие в размере 10000

		рублей.
12.	Расходы на эксплуатацию и содержание инициативного проекта на первый и последующие годы (при наличии)	Эксплуатация и содержание волейбольно-баскетбольной площадки и турниковой зоны после реализации проекта будет осуществлено через трудовую деятельность штатных сотрудников МБОУ «Гимназия №123», ремонт и обслуживание с использованием бюджетных и внебюджетных средств МБОУ «Гимназия №123».
13.	Информация об инициаторах проекта	
14.	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя инициативного проекта, номер телефона, почтовый и электронный адрес	

Руководитель инициативной группы
проекта)


(подпись)


(фамилия, имя,)
(при наличии)



ООО «Красный Кит»
656063, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Попова 5Г

ОГРН 112224004859
ИНН 2224155276
КПП 222401001

13 октября 2025 г.

г. Барнаул

Коммерческое предложение по элементам спортивного оборудования,
от компании «Красный Кит»:

№ /п	Наименование	Обозначение, размеры ДхШхВ, мм	Цена, руб	Кол-во, шт	Сумма, руб	Рисунок
1	Спортивное оборудование	Романа 501.55.01, 2768x2419x2518	71987	1	71987	
2	Спортивное оборудование	Романа 501.47.01, 4687x1687x2518	92381	1	92381	
3	Спортивное оборудование	Романа 501.18.01, 4175x701x1818	79972	1	79972	
Итого по оборудованию:					244340	
Монтаж оборудования					48860	
Итого всего с монтажом:					293200	

Общая стоимость оборудования и материалов, с учетом доставки и установки составляет 293200 рублей.
Эта стоимость включает в себя все расходы по доставке и установке оборудования.

Директор ООО «Красный Кит»:
МП Батов А. А.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2025 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Министра России от 22.08.2025 № 49743-АП/09

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 21.04.2025 № 275

22. Алтайский край

Алтайский край

МБОУ «Гимназия №123»

(наименование стройин)

Баскетбольно-волейбольная площадка с тренажерной зоной

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Гимназия 123 баскетбольно волейбольная площадка с тренажерной зоной

(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	3 кв. 2025, ФСНБ-2022 (изм.1-15) (проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен	III квартал 2025 года	
Сметная стоимость	4 577,828 тыс.руб.	
в том числе:		
строительных работ	3 814,86 тыс.руб.	
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	
оборудования	0,00 тыс.руб.	
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих	138,88	тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	19,34	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	319,22	чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	34,91	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство баскетбольно-волейбольной площадки (32*19)											
1	ГЭСНр68-02-004-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Объем=((23*11*0,05) / 100 1 ОТ(ЗТ) 1-100-27 Средний разряд работы 2,7 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.12.06-012 Рыхлители прицепные (без трактора) 91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные) Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	100 м3 чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч	0,1265 155 1,55 1,55 1,29 37,5 37,5 75	1 <						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П/Н	2 ЭМ										
	ОТМ(3Тм)					2,33472					4 030,87
	91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		чел.-ч	2,52		1,53216	887,54	1,46	1 295,81		1 460,29
	4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	2,52		1,53216			638,21		1 985,39
	91.08.03-029 Катки самоходные пневмокопесные статические, масса 16 т		чел.-ч	2,52		0,62016			977,84		
	4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	1,02		0,62016	2 190,26	1,42	3 110,17		1 928,80
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	1,02		0,62016			638,21		395,79
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,3		0,1824			639,71		116,68
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,3		0,1824			475,11		86,66
	08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг		т	0,00013		0,000079	55 898,18	1,51	84 406,25		6,67
П/Н	01.7.12.05-1018 Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2		м2	0		0					6,67
	Итого прямые затраты										12 126,01
	ФОТ		%	147		147					8 088,47
	Пр/812-021.0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	134		134					11 890,05
	Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16		%								10 838,55
	Всего по позиции						57 325,66				34 854,61
	5.1 ФЭСБЦ-01.7.12.05-1016 Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 500 г/м2		м2	608	1	608	61,40	1,42	87,19		53 011,52
	Объем=φ1*1000										
	Всего по позиции										53 011,52
6	ГЭСН27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня		100 м3	0,608	1	0,608					
	Объем=(32*19*0,1)/100										
	Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 88,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; 3ПМ=0,65; 3ТМ=0,65		чел.-ч			13,1328					5 215,17
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	21,6		13,1328			397,11		5 215,17
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3										22 488,93
	2 ЭМ										5 039,08
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			8,14112					1 326,35
	91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		маш.-ч	2,59	0,65	1,023568	887,54	1,46	1 295,81		653,25
	4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,59	0,65	1,023568			638,21		2 512,54
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	2,3	0,65	0,90896	1 933,00	1,43	2 764,19		580,11
П/Н	4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,3	0,65	0,90896			638,21		1 666,72
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмокопесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	2,46	0,65	0,972192			1 714,39		530,84
	4-100-050 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	2,46	0,65	0,972192			546,02		16 387,37
	91.08.03-030 Катки самоходные пневмокопесные статические, масса 30 т		маш.-ч	12,21	0,65	4,825392	2 391,60	1,42	3 396,07		3 079,61
	4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	12,21	0,65	4,825392			638,21		595,95
	91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3		маш.-ч	1,04	0,65	0,411008	1 043,14	1,39	1 449,96		195,27
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,04	0,65	0,411008			475,11		109,46
	4 М										109,46
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	7		4,256			25,72		
	02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород		м3	0		0					32 852,64
П/Н	Итого прямые затраты										10 254,25
	ФОТ		%	147		147					15 073,75
	Пр/812-021.0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	134		134					13 740,70
	Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16		%								61 667,09
	Всего по позиции						101 426,13				100 459,13
	6.1 ФЭСБЦ-02.2.04.04-0125 Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм		м3	76,608	1	76,608	1 725,45	0,76	1 311,34		
	Объем=МАСТЕР*1,26*100										
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТМ(3Тм)	чел.-ч			0,663					416,47
			маш.-ч	0,61		0,6222			1 654,90		1 029,68
			чел.-ч	0,61		0,6222			638,21		397,09
			маш.-ч	0,04		0,0408			639,71		26,10
			чел.-ч	0,04		0,0408			475,11		19,38
П.Н	Н	4 М									2 765,89
			Т	0,001		0,00102	70 296,20	1,29	90 682,10		92,50
			М3	0,06	0,33	0,020196	3 778,62	1,71	6 461,44		130,50
			М3	0,17		0,1734			14 664,88		2 542,89
			М3	0		0					
		Смеси бетонные тяжелого бетона	М3	5,9	0,86	5,17548					34 025,12
											30 203,45
											44 399,07
											40 472,62
											118 896,81
9.1	ФСБЦ-05.2.03.03-0012	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)	М3	1,632	1	1,632	5 746,75	2,08	11 953,24		19 507,69
Объем=МАСТЕР*100*0,016											
9.2	ФСБЦ-04.1.02.01-0006	Всего по позиции	М3	5,17548	1	5,17548			7 108,13		36 787,98
Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)											
10	ТЦ_102_22_2221256406_24_01.2024_02	Монтаж бесшовного покрытия из резиновой крошки спортивной площадки, толщина 10 мм (с материалом)	М2	608	1	608			2 333,33		1 418 664,64
Объем=32*19											
Цена=2800/1,2											
11	ГЭСН15-04-029-02	Всего по позиции	100 м2	0,15835	1	0,15835					
		Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 2 раза (разметка)	100 м2								842,62
			чел.-ч			1,77352					842,62
			чел.-ч	11,2		1,77352			475,11		3,13
			1 ОТ(3Т)								2,93
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0								0,09
			2 ЭМ								0,67
			ОТМ(3Тм)			0,006334	37,32	1,57	58,59		3,04
			маш.-ч	0,01		0,0015835			421,93		2,26
			чел.-ч	0,01		0,0015835			639,71		13,51
			маш.-ч	0,03		0,0047505			475,11		3,16
			чел.-ч	0,03		0,0047505					10,35
			4 М								
			кг	0,2		0,03167	56,11	1,78	99,88		
			Т	0,0006		0,000095	67 231,42	1,62	108 914,90		
			т	0,0208		0,002937					
Н	14.4.03.06	Лак									862,19
Итого прямые затраты											845,55
		ФОТ									845,55
			%	100		100					414,32
			%	49		49					2 122,06
											481,67
11.1	ФСБЦ-01.5.01.01-1000	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый	кг	3,2937	1	3,2937	115,15	1,27	13 401,07		146,24
Всего по позиции											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем=Ф10, р1*1000											
Всего по позиции											
12	ГЭСН09-08-001-04	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=41 / 100	100 шт	0,41	1	0,41					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,8957			421,93		6 706,87
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	38,77		15,8957					6 706,87
	2 ЭМ										20 147,43
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			10,2623		1,34	2 798,95		5 575,51
	91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м		маш.-ч	12,9		5,289					14 803,65
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	12,9		5,289			546,02		2 887,90
	91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3		маш.-ч	11,17		4,5797	788,55	1,41	1 111,86		5 091,99
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	11,17		4,5797			546,02		2 500,61
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,96		0,3936			639,71		251,79
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,96		0,3936			475,11		187,00
	4 М										2 700,06
	11.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ		м3	0,13975		0,0572975			47 123,51		2 700,06
H	04.1.02.05 Смесей бетонные тяжёлого бетона		м3	8,3		3,403					
H	07.2.07.11 Стойки металлические опорные		шт	100		41					
Итого прямые затраты											
ФОТ											
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	93		93					35 129,87
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	62		62					12 282,38
	774/пр от 11.12.2020 п.16										11 422,61
	774/пр от 11.12.2020 п.16										7 615,08
Всего по позиции											
12.1	ФСБЦ-04.1.02.01-0005	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150)	м3	3,403	1	3,403	4 116,45	1,81	7 450,77		54 167,56
Всего по позиции											
13	ГЭСН09-08-002-05	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м Объем=((102-2,5)/2,5) / 10	10 шт	3,98	1	3,98					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			28,2978			421,93		11 939,69
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	7,11		28,2978					11 939,69
	2 ЭМ		чел.-ч								464,94
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,7064					1 285,83
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,11		0,4378			639,71		280,07
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,11		0,4378			475,11		208,00
	91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт		маш.-ч	0,57		2,2686			81,49		184,87
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,57		2,2686			475,11		1 077,83
H	01.5.02.01 Детали крепления барьерных ограждений		компл	120		477,6					
H	01.5.02.02 Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений		шт	10		39,8					
Итого прямые затраты											
ФОТ											
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	93		93					13 690,46
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	62		62					13 225,52
	774/пр от 11.12.2020 п.16										12 299,73
	774/пр от 11.12.2020 п.16										8 199,82
Всего по позиции											
14	ГЭСН09-08-002-07	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 шт	0,2	1	0,2			8 590,45		34 190,01
Объем=2 / 10											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,662			421,93		279,32
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	3,31		0,662					279,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										
	ОТм(ЗТм)										
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч			0,08			639,71		19,91
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,12		0,024			475,11		38,01
	91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт		чел.-ч	0,12		0,024			475,11		15,35
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,28		0,056			81,49		11,40
	01.5.02.01 Детали крепления барьерных ограждений		чел.-ч	0,28		0,056			475,11		4,56
H	08.1.06.05 Калилка для барьерных ограждений		компл	20		4					26,61
H	Итого прямые затраты		шт	10		2					
	ФОТ										337,24
	Пр/812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции		%	93		93					317,33
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	62		62					295,12
	Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции		%								196,74
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
15	ТС_01.5.02.01_22_22228600 Ограждение из сварной сетки (2030мм*2) 3D ячейка (50*200)с крепежем, со столбами 5м, с заглушками+ 2 капитли распашных Цена=7500/1,2	м		102	1	102			4 145,50		829,10
	Всего по позиции								6 250,00		637 500,00
	Всего по позиции										637 500,00
	Итого по разделу 1 Устройство баскетбольно-волейбольной площадки (32*19) :										3 127 933,80
	Всего прямые затраты (справочно) в том числе:										
	Оплата труда рабочих										135 570,49
	Эксплуатация машин										52 275,11
	Оплата труда машинистов (Отм)										16 654,94
	Материалы										2 913 390,58
	Перевозка										10 042,88
	Строительные работы										3 448 287,00
	Строительные работы в том числе:										3 438 244,32
	оплата труда эксплуатация машин и механизмов										135 570,49
	оплата труда машинистов (Отм)										52 275,11
	материалы										16 654,94
	накладные расходы сметная прибыль										2 913 390,58
	Перевозка										182 049,90
	Всего ФОТ (справочно)										138 303,30
	Всего накладные расходы (справочно)										10 042,88
	Всего сметная прибыль (справочно)										152 225,43
	Всего по разделу 1 Устройство баскетбольно-волейбольной площадки (32*19) справочно:										182 049,90
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										138 303,30
	Затраты труда рабочих										3 448 287,00
	Затраты труда машинистов										2 056 164,64
	Раздел 2. Малые формы										
16	ГЭСН09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=4 / 100 1 ОТ(ЗТ) 1-100-30 Средний разряд работы 3.0 2 ЭМ	100 шт		0,04	1	0,04					
			чел.-ч			1,4256			421,93		601,50
			чел.-ч	35,64		1,4256					1 722,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТМ(3Тм)									
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	чел.-ч	10,93		0,8992					488,68
	4-100-050	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	маш.-ч			0,4372	2 088,77	1,34	2 798,95		1 223,70
	91.14.01-003	Автобетоносисегители, объем барабана 6 м3	чел.-ч	10,93		0,4372			546,02		238,72
	4-100-050	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	маш.-ч	10,74		0,4296	788,55	1,41	1 111,86		477,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	10,74		0,4296			546,02		234,57
	4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,81		0,0324			639,71		20,73
	4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81		0,0324			475,11		15,39
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,00559			47 123,51		263,42
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		0,2536					263,42
	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		4					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
	Пр/812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	93		93					3 075,69
	Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	62		62					1 090,18
											1 013,87
											675,91
17	ФСБЦ-04.1.02.01-0005	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150)	м3	0,2536	1	0,2536	4 116,45	1,81	7 450,77		4 765,47
		Всего по позиции									1 889,52
		Всего по позиции									13 666,67
17.1	TLL_102_22_2222860018_24_01.2024_02	СО-15 Стойки волейбольные (пара)	шт.	1	1	1			13 666,67		
		Цена=16400,00/1,2									
		Всего по позиции									
17.2	TLL_102_22_2222860018_24_01.2024_02	СО-42 Стойка баскетбольная со щитом	шт.	2	1	2			44 166,67		
		Цена=53000,00/1,2									
		Всего по позиции									
17.3	TLL_102_22_2222860018_24_01.2024_02	Сетка волейбольная	шт.	1	1	1			8 333,33		
		Цена=10000,00/1,2									
		Всего по позиции									
17.4	TLL_102_22_2222860018_24_01.2024_02	Сетка баскетбольная	комп.	1	1	1			833,33		
		Цена=1000,00/1,2									
		Всего по позиции									
		Итого по разделу 2 Малые формы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									116 131,88
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									601,50
		Эксплуатация машин									1 722,09
		Оплата труда машинистов (Отм)									488,68
		Материалы									113 319,61
		Строительные работы									117 821,66
		в том числе:									
		оплата труда									601,50
		эксплуатация машин и механизмов									1 722,09
		оплата труда машинистов (Отм)									488,68
		материалы									113 319,61
		накладные расходы									1 013,87
		сметная прибыль									675,91
		Всего ФОТ (справочно)									1 090,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего накладные расходы (справочно)									1 013,87
		Всего сметная прибыль (справочно)									675,91
		Всего по разделу 2 Малые формы									117 821,66
		справочно:									111 166,67
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН				1,4256					
		Затраты труда рабочих				0,8992					
		Затраты труда машинистов									
Раздел 3. Тренажерная зона											
18	ГЭСН09-08-001-01	Демонтаж металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=10 / 100	100 шт	0,1	1	0,1					
	648/пр_2022_п.145_т.3_стр.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									451,13
	–стб 3	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,0692					451,13
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64	0,3	1,0692			421,93		1 291,56
	2 ЗМ										366,52
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,6744		1,34	2 798,95		917,78
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93	0,3	0,3279			546,02		179,04
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93	0,3	0,3279			1 111,86		358,24
	91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74	0,3	0,3222	788,55	1,41	546,02		175,93
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74	0,3	0,3222			639,71		15,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81	0,3	0,0243			475,11		11,55
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81	0,3	0,0243					0,00
	4 М								47 123,51		0,00
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975	0	0					817,85
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34	0	0					760,41
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100	0	0					506,94
		Итого прямые затраты							33 765,60		3 376,56
		ФОТ									2 109,21
	Пр/812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции		%	93		93					817,85
	812/пр от 21.12.2020 п.25								421,93		760,41
	Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции		%	62		62					506,94
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
19	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=15 / 100	100 шт	0,15	1	0,15					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,346					2 255,64
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64		5,346					2 255,64
	2 ЗМ										6 457,81
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			3,372		1,34	2 798,95		1 832,57
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93		1,6395					4 588,88
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93		1,6395			546,02		895,20
	91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74		1,611	788,55	1,41	1 111,86		1 791,21
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74		1,611			546,02		879,64
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81		0,1215			639,71		77,72
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81		0,1215			475,11		57,72
	4 М										987,82
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,0209625			47 123,51		987,82
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		0,951					
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		15					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции											
812/пр от 21.12.2020 п.25											
Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции											
774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
19.1	ФСБЦ-04.1.02.01-0006	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	м3	3,3602	1	3,3602			119 137,20		17 870,58
Всего по позиции											
19.2	ТЛ_102_22_2224155276_28. 09.2025_02	Спортивное оборудование Romapa 501.55.01, 2768х2419х2518 турник 3 Цена=71987/1,2	шт.	1	1	1			59 989,17		59 989,17
Всего по позиции											
19.3	ТЛ_102_22_2224155276_28. 09.2025_02	Спортивное оборудование Romapa 501.47.01, 4687х1687х2518 турник 4 Цена=92381/1,2	шт.	1	1	1			76 984,17		76 984,17
Всего по позиции											
19.4	ТЛ_102_22_2224155276_28. 09.2025_02	Спортивное оборудование Romapa 501.18.01, 4175х701х1818 брусья Цена=79972/1,2	шт.	1	1	1			66 643,33		66 643,33
Всего по позиции											
Итого по разделу 3 Тренажерная зона :											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
Всего по разделу 3 Тренажерная зона											
справочно:											
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											
Затраты труда рабочих											
Затраты труда машинистов											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительные работы										3 804 814,53
	в том числе:										
	оплата труда										138 878,76
	эксплуатация машин и механизмов										61 746,57
	оплата труда машинистов (Отм)										19 342,71
	материалы										3 255 199,43
	накладные расходы										187 626,22
	сметная прибыль										142 020,84
	Перевозка										10 042,68
	Всего ФОТ (справочно)										158 221,47
	Всего накладные расходы (справочно)										187 626,22
	Всего сметная прибыль (справочно)										142 020,84
	НДС 20%										762 971,44
	ВСЕГО по смете										4 577 826,00
	справочно:					319,22212					
	Затраты труда рабочих					34,913149					
	Затраты труда машинистов										


Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]


1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

з Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.


з Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

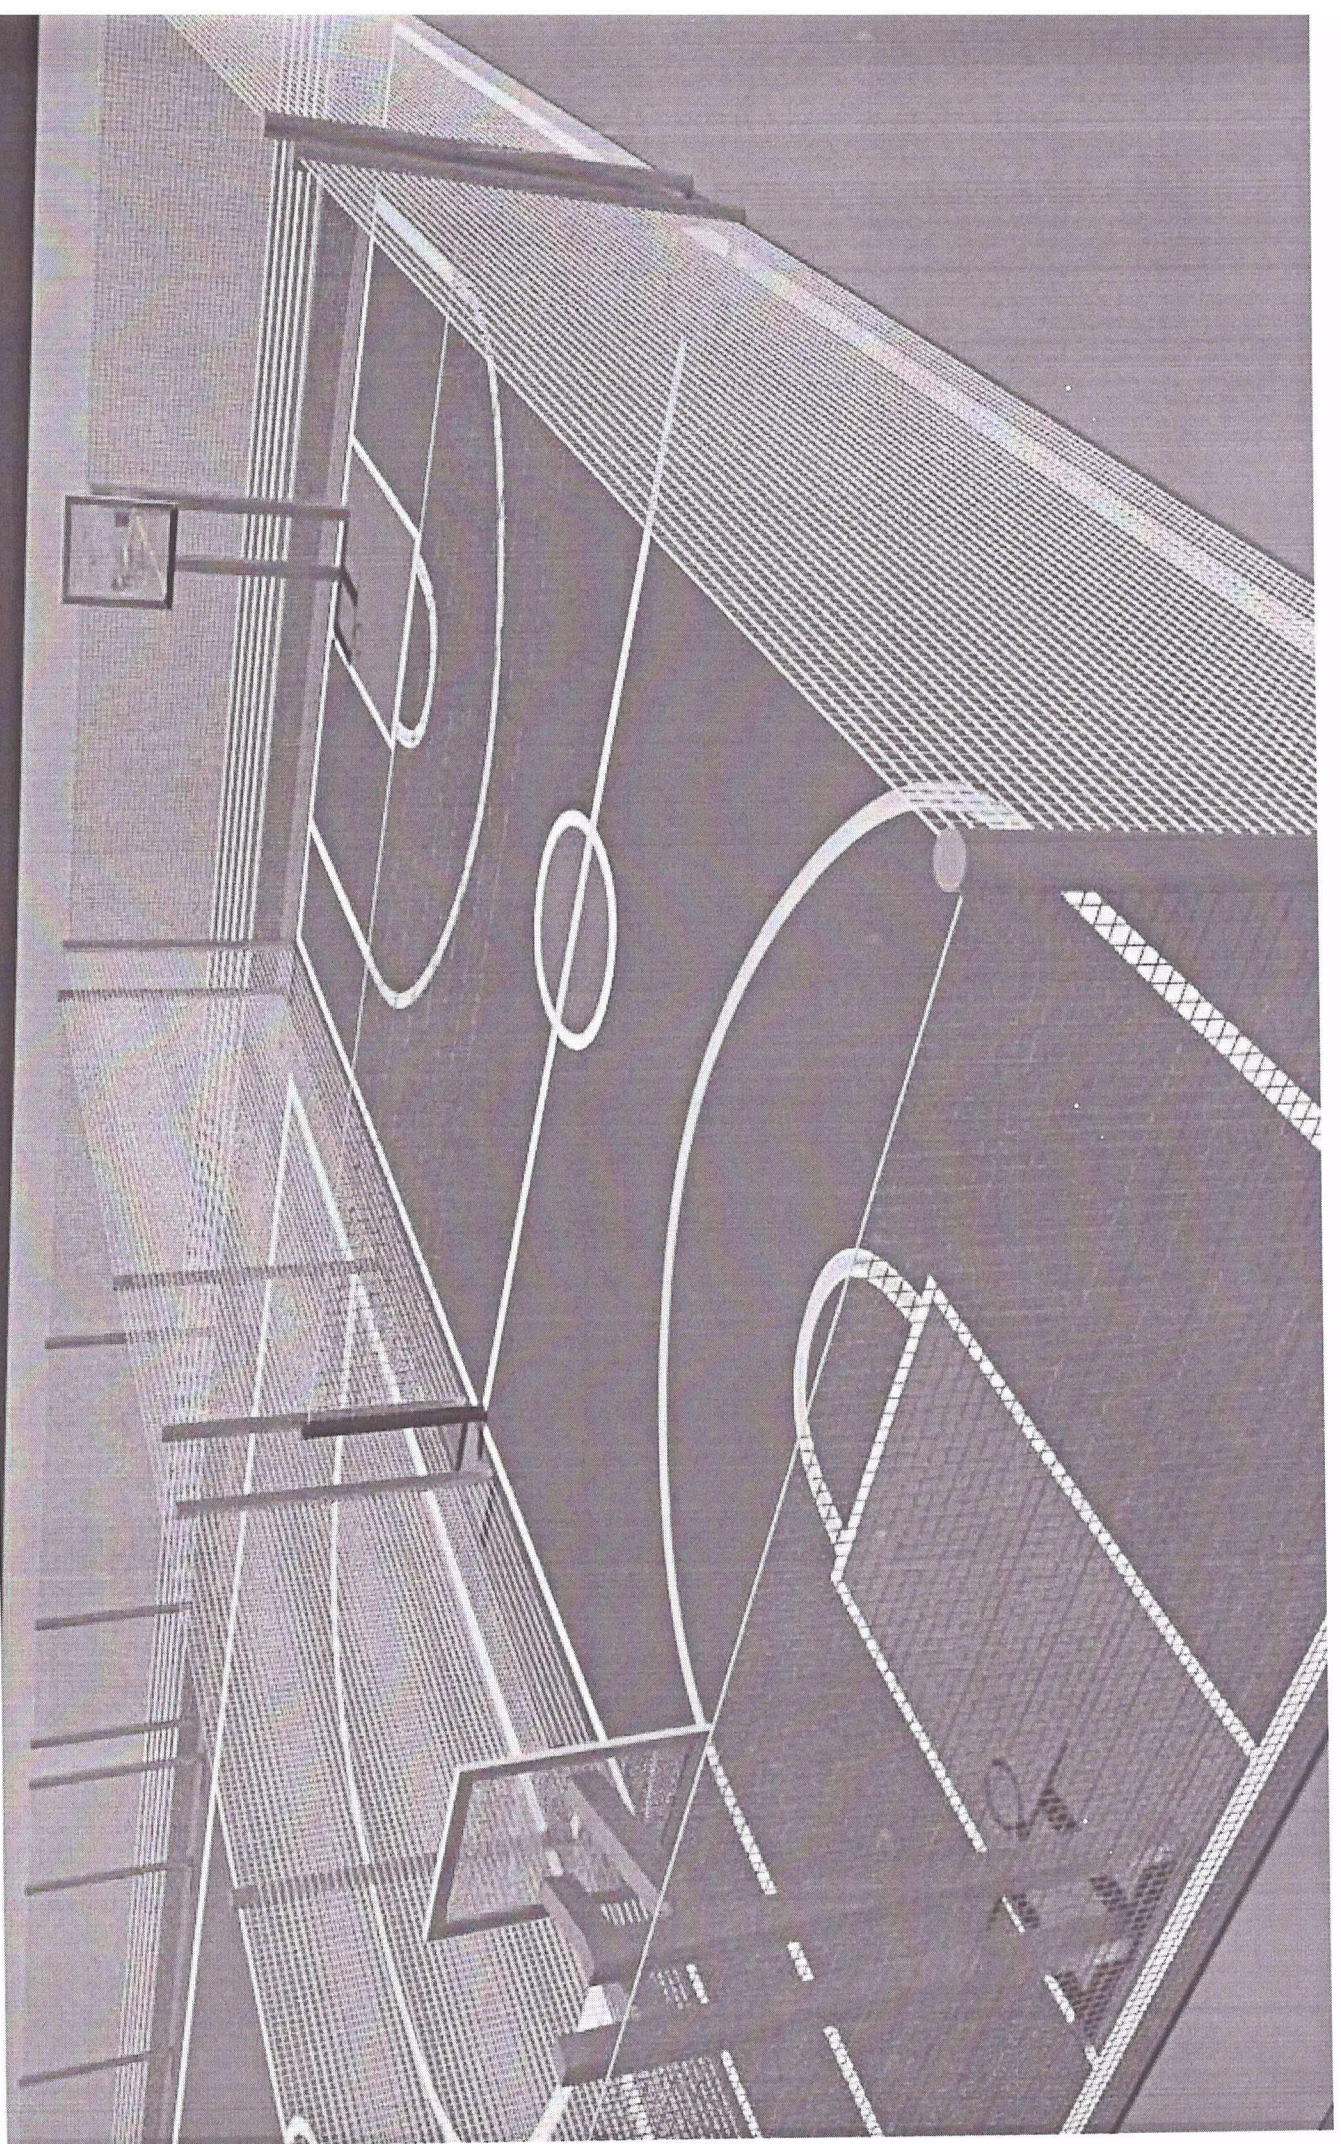




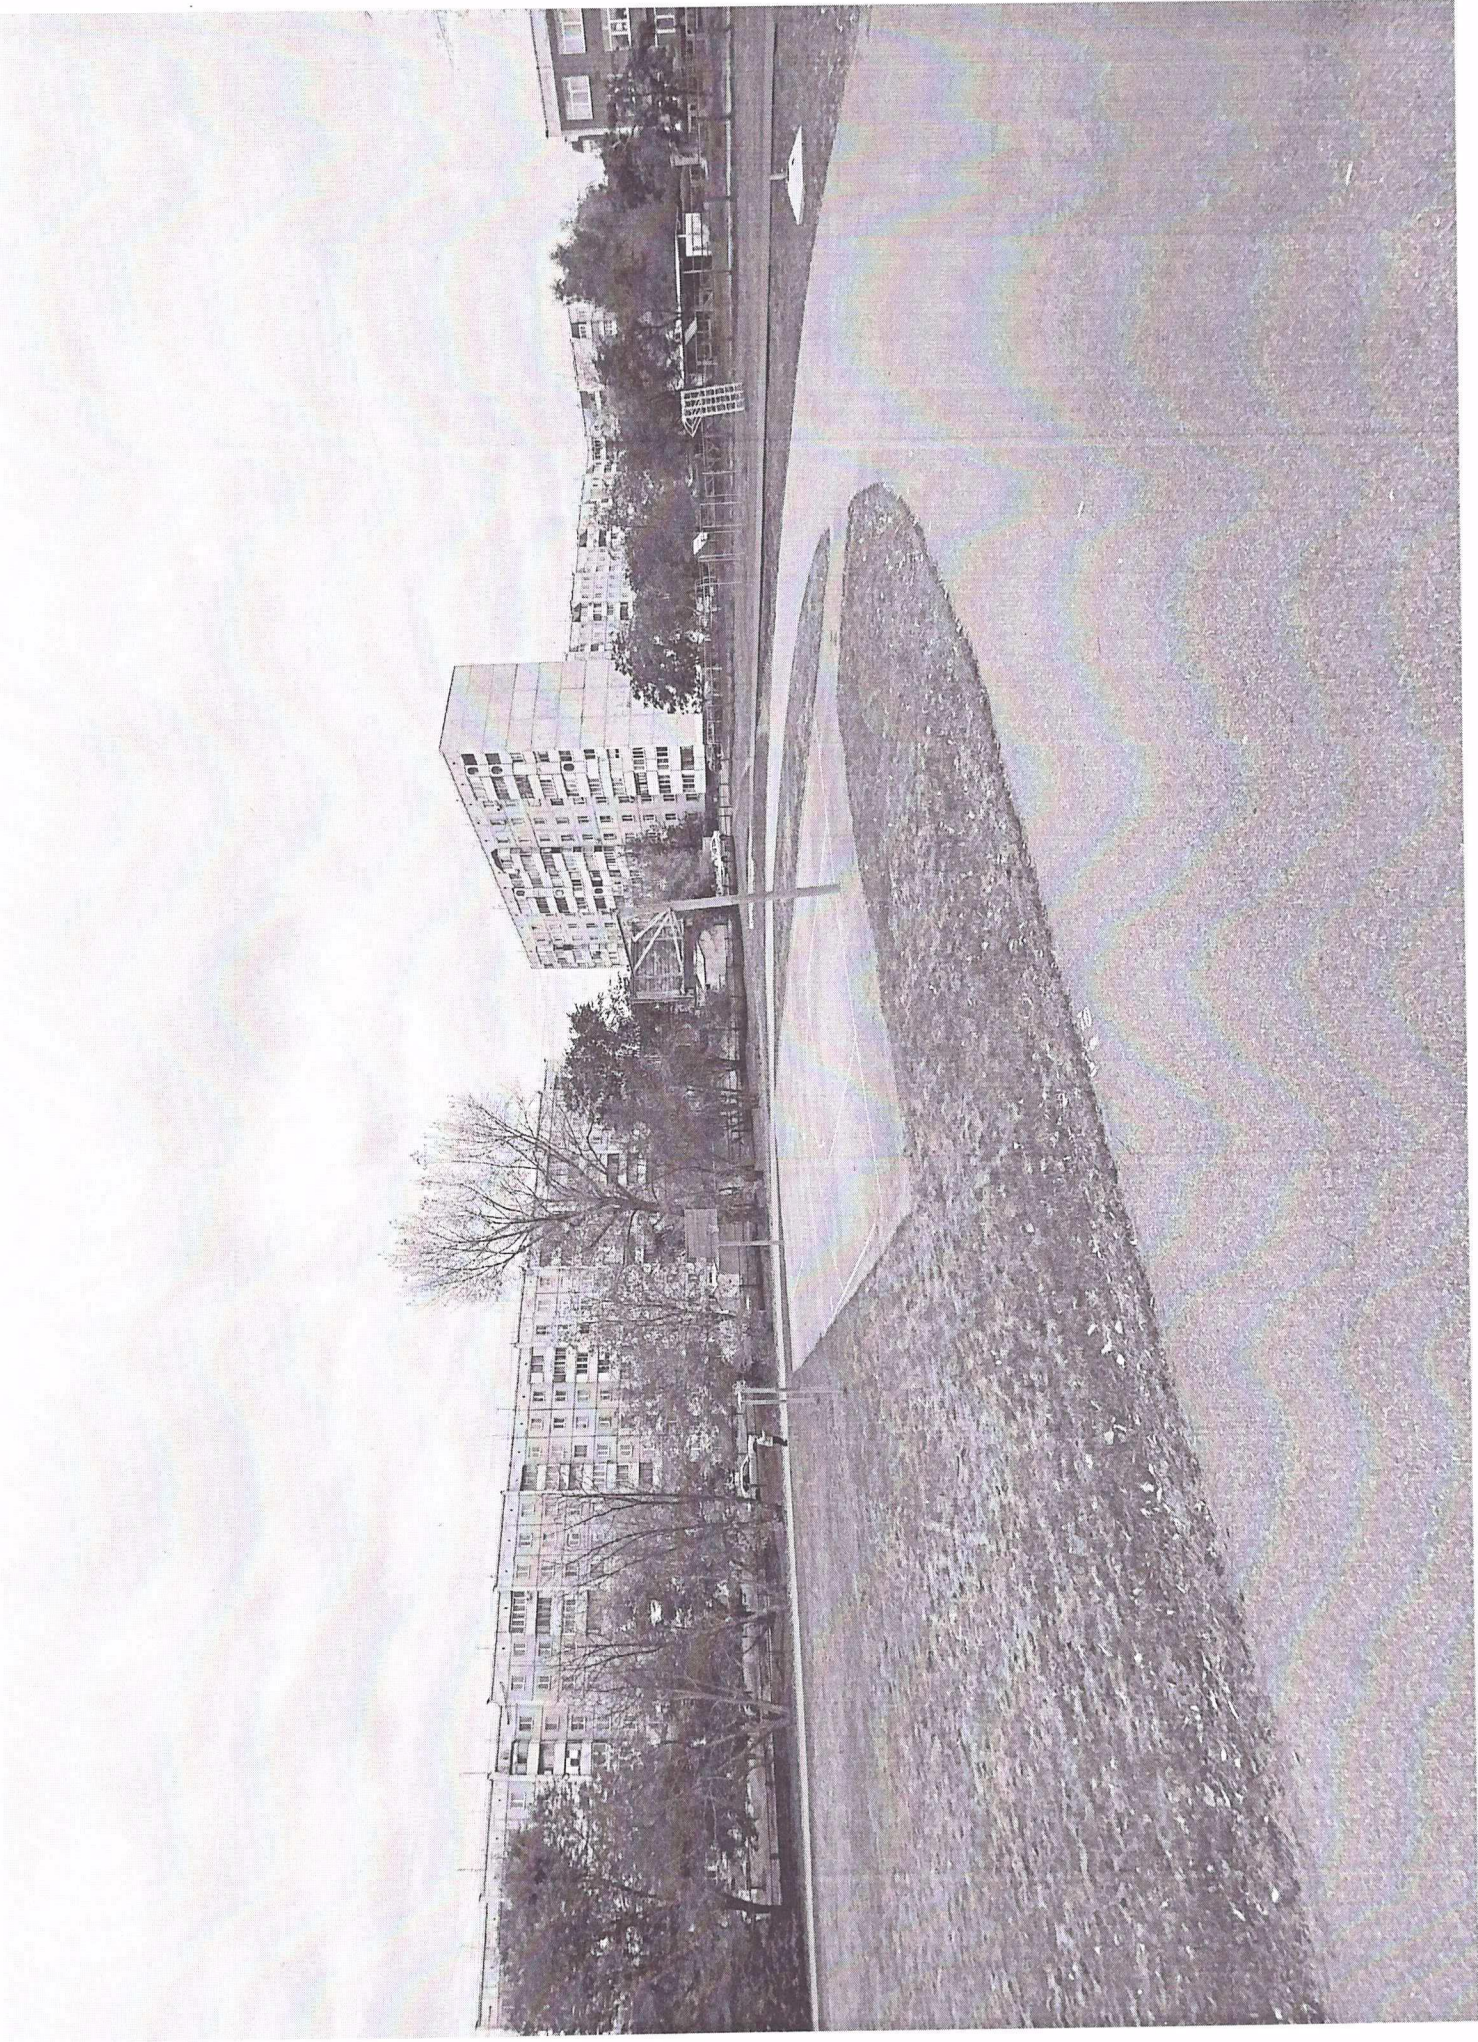



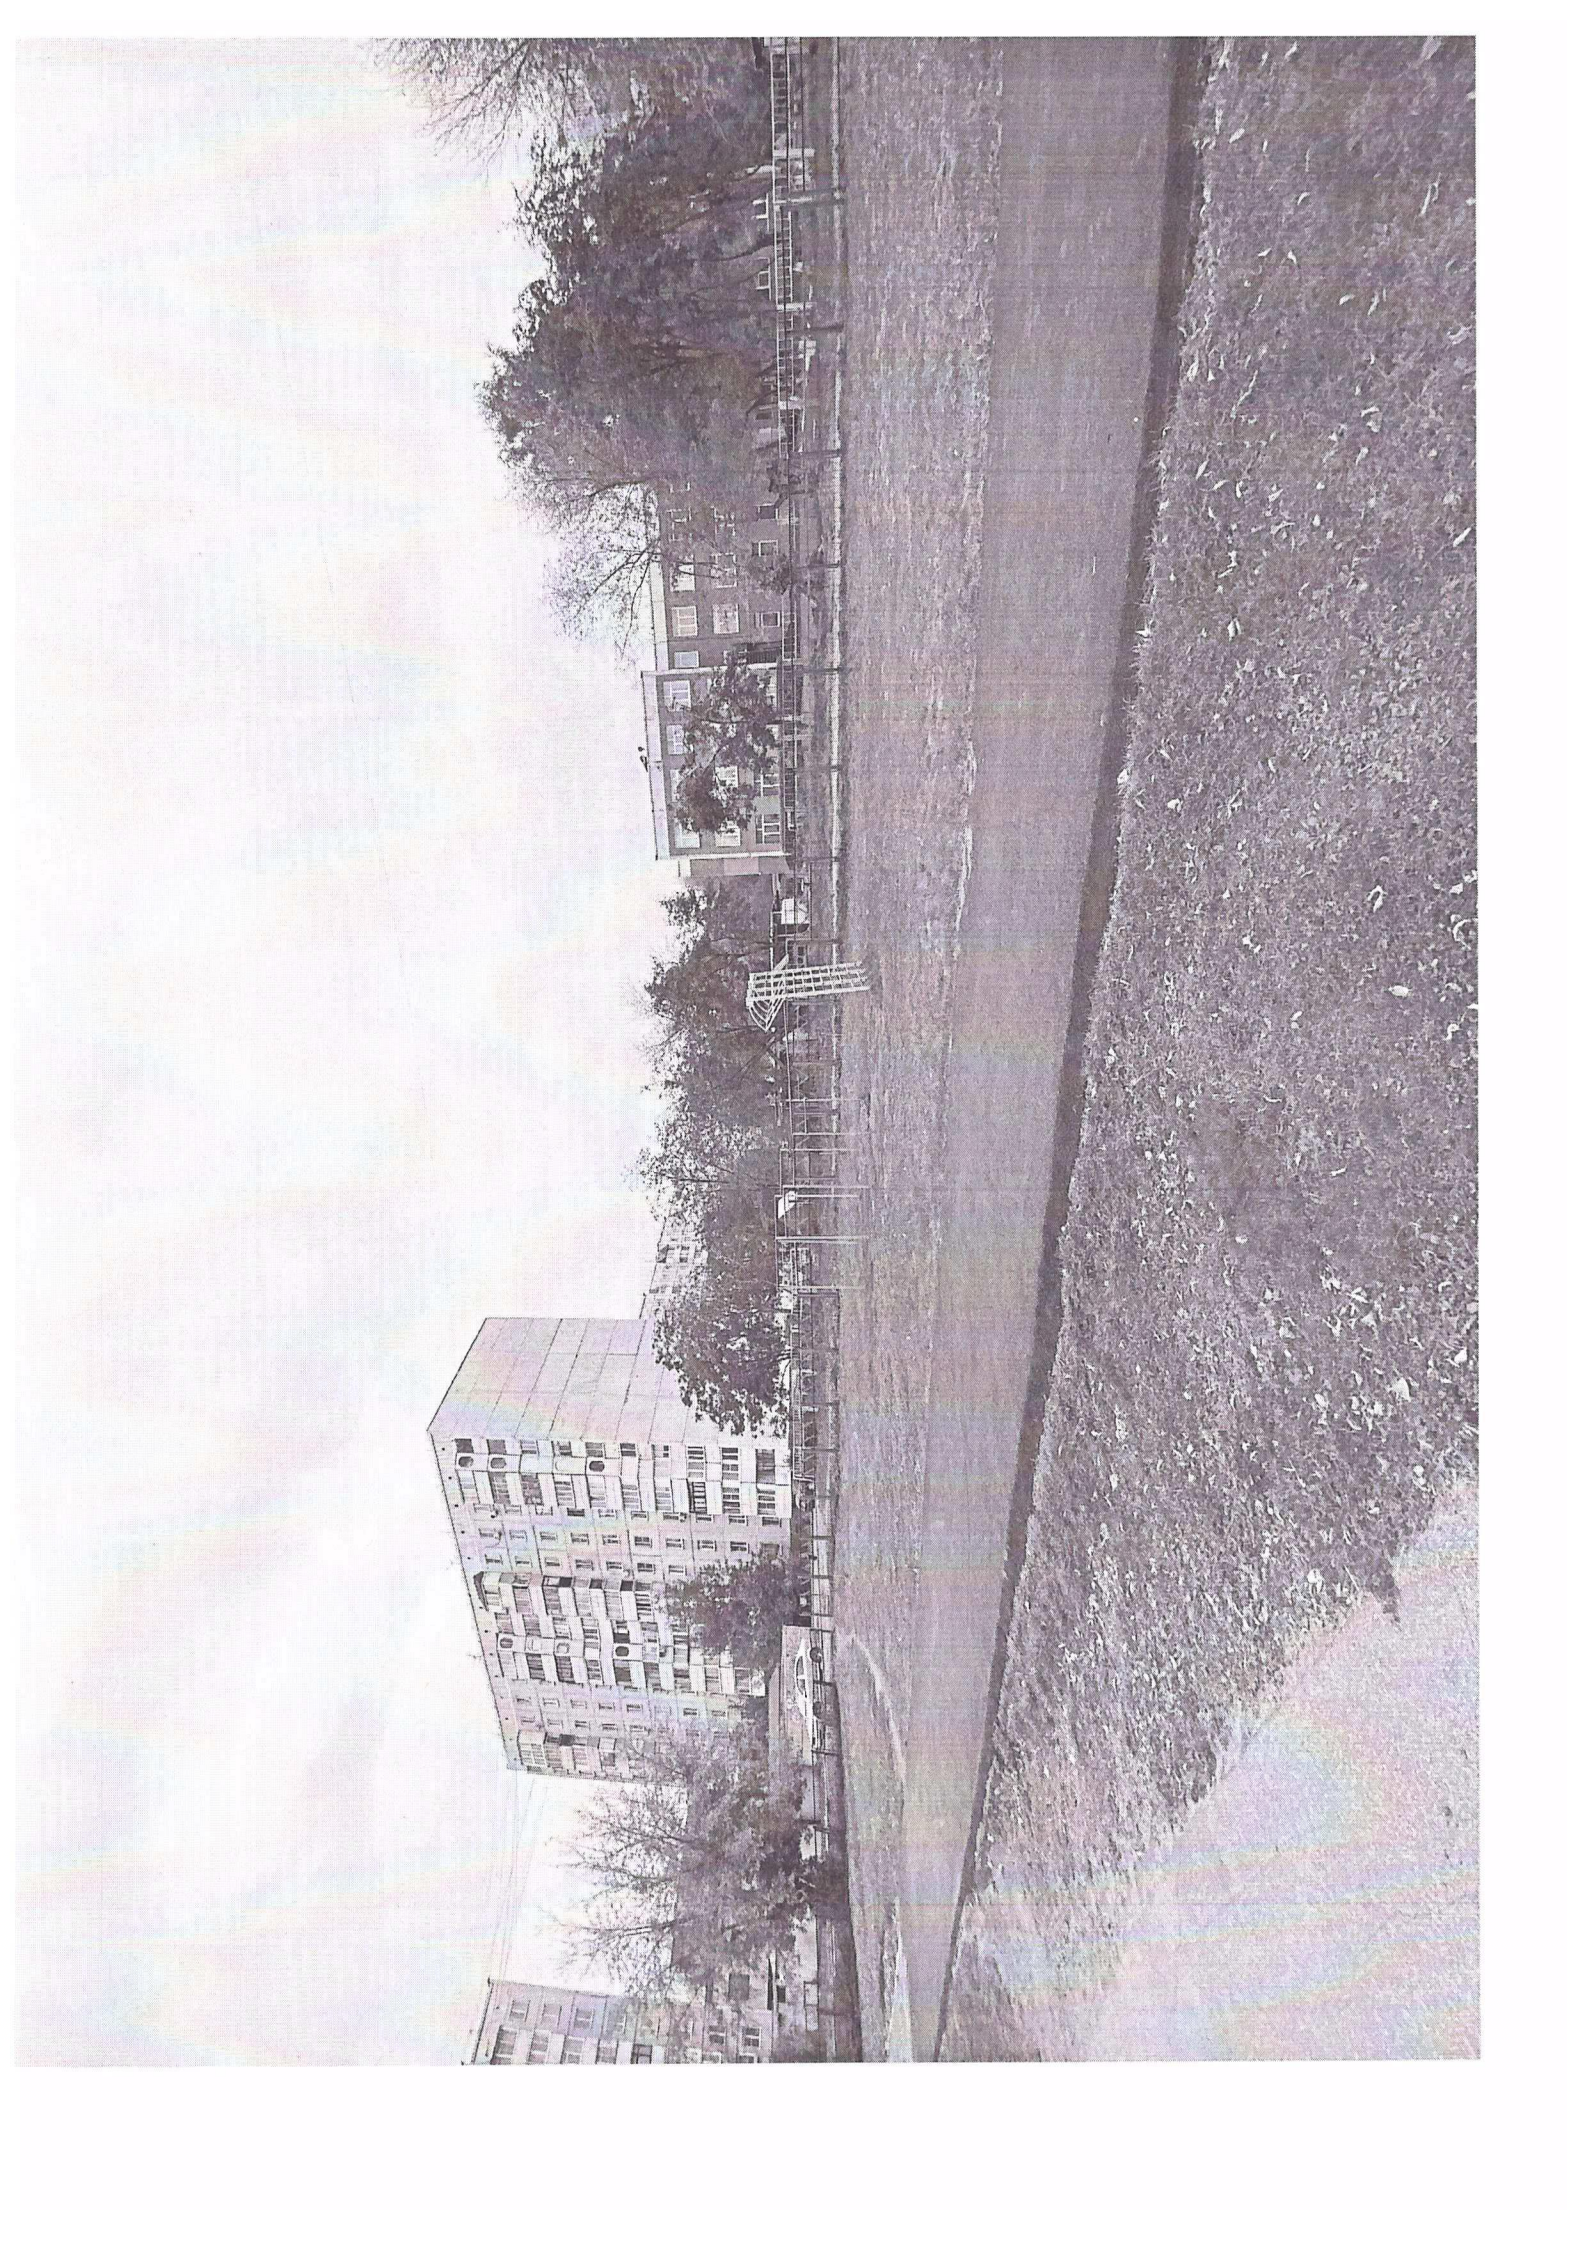

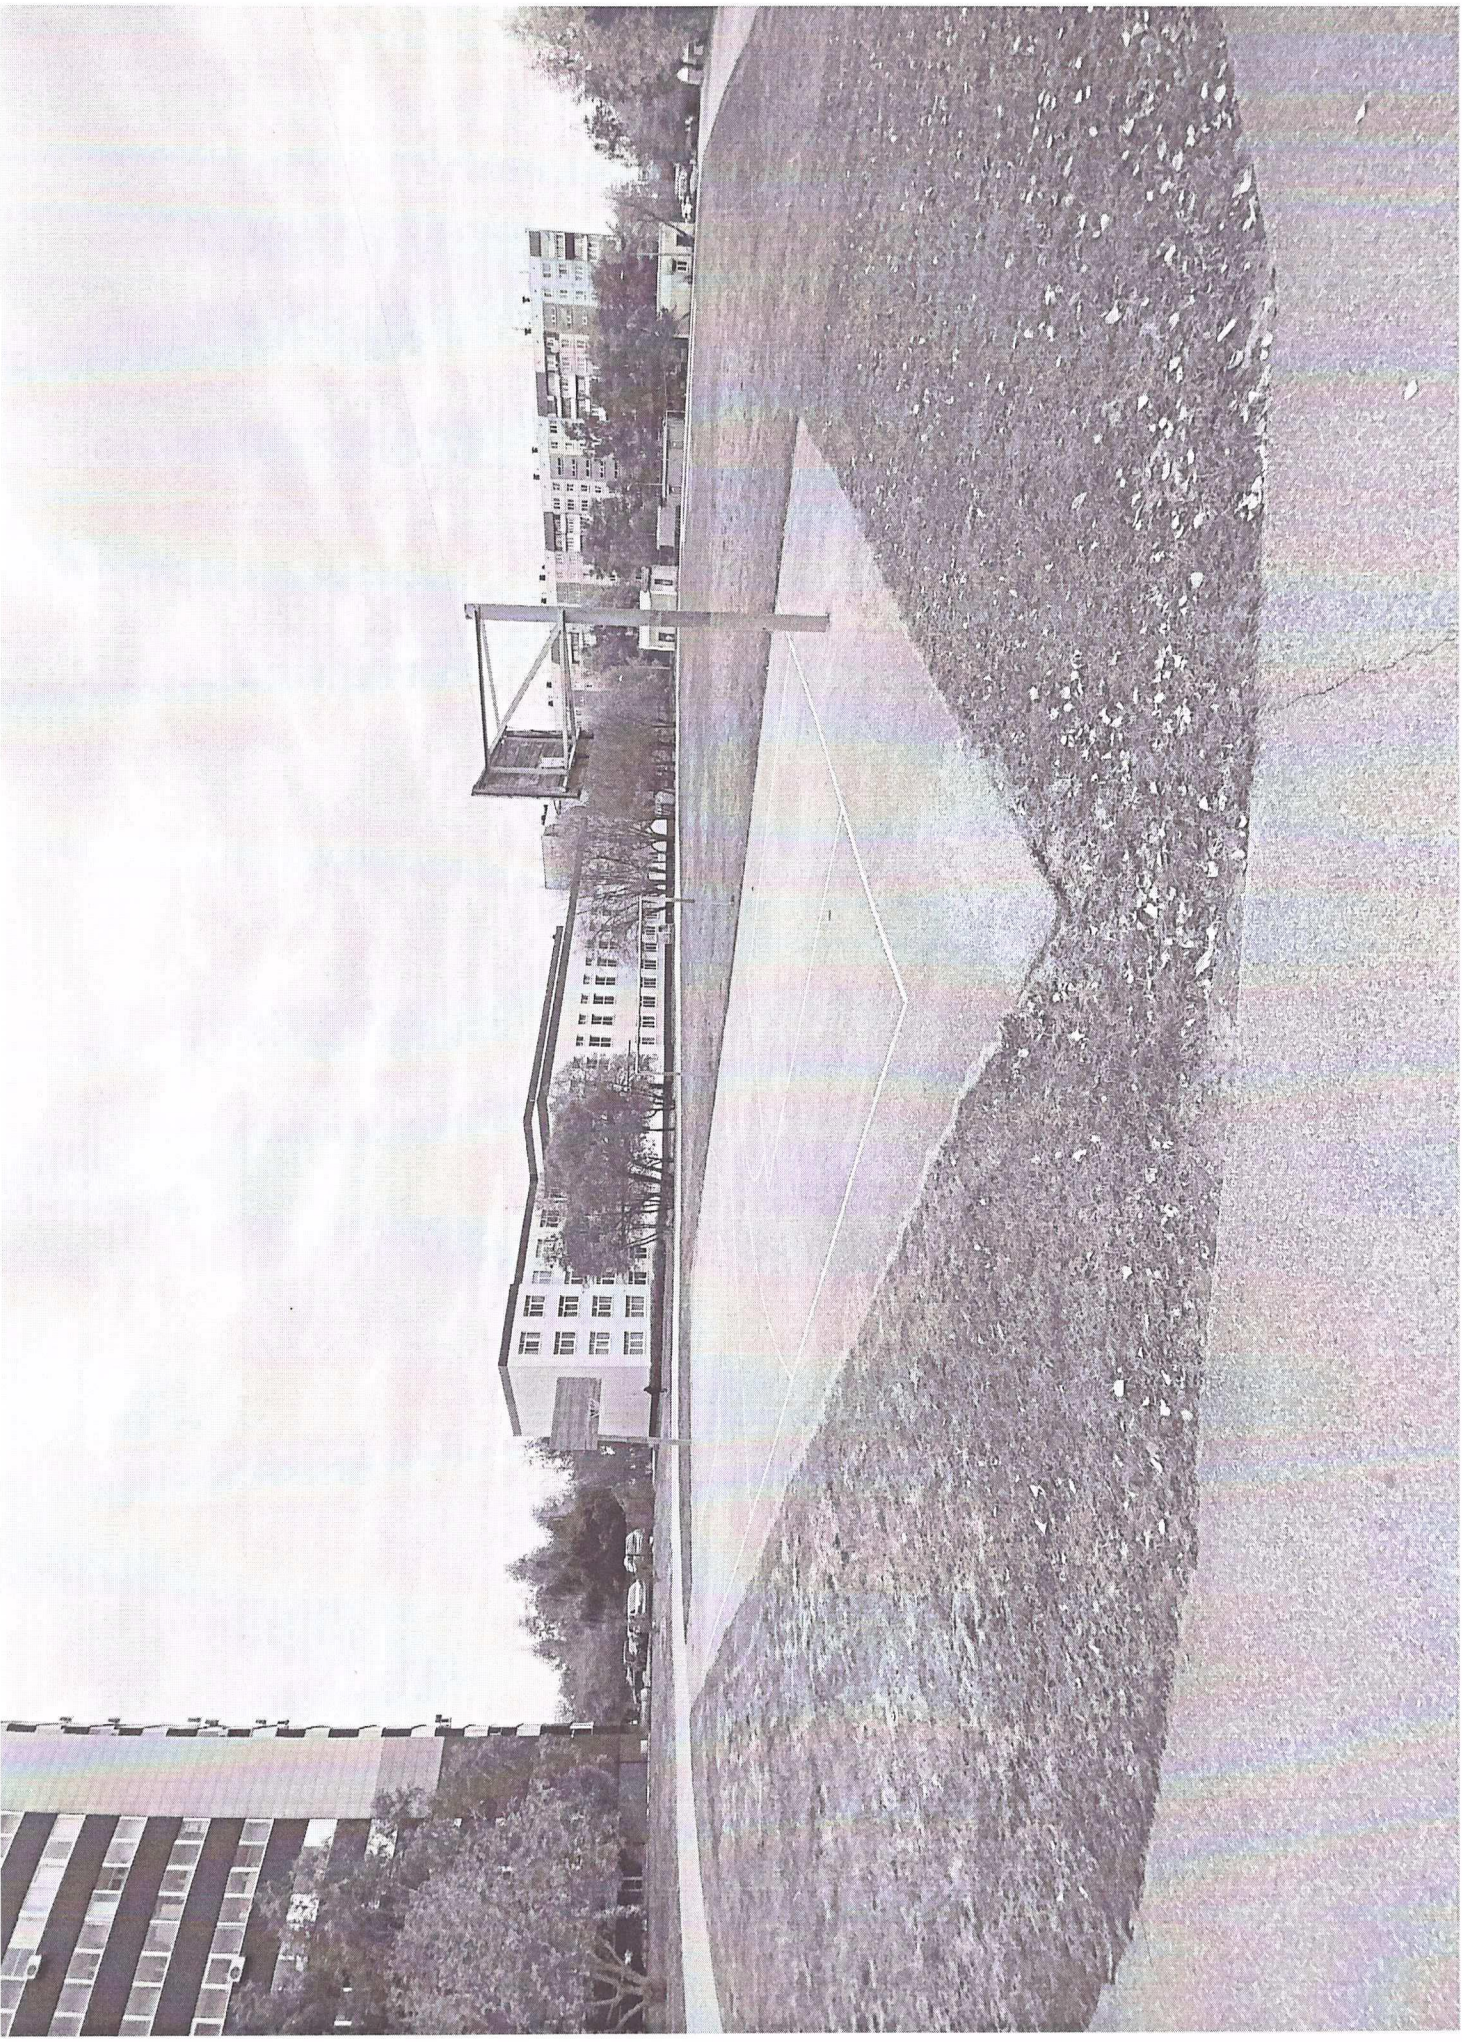

ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ООО «АлтайГлавБух»

ИНН 2222822559, КПП 222101001, 656031, Алтайский край, Барнаул г, Строителей пр-кт, дом 135, офис 306
тел.: (3852)690-480

Руководителю инициативного проекта

«Территория здоровья»

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

во исполнение предоставления финансовых средств благодарителя

г. Барнаул

01.10.2025

С целью софинансирования проекта «Территория здоровья». Мы предлагаем помощь в реализации данного проекта в рамках инициативного бюджетирования инициативных проектов в городском округе - городе Барнауле в виде дополнительного финансирования. В случае получения проектом финансовых средств на реализацию из городского бюджета Финансовые средства в размере 10000 руб. гарантируем предоставить с расчетного счета № 40702810402000003201, к/с 30101810200000000604, БИК 040173604 в срок до 31.08.2026 г. банковским переводом на предоставленные реквизиты.

Руководитель _____ Карпунькин Р.Н.



Общество с ограниченной ответственностью "Агро Индустрия"

Юридический адрес: 656045, Алтайский край, г Барнаул, тракт Змеиногорский, д. 104а, кв. 8,
ИНН / КПП 2221222774 / 222501001, ОГРН 1152225019803

Руководителю инициативного проекта

«Территория здоровья»

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО во исполнение предоставления финансовых средств благодарителя

г. Барнаул

01.10.2025

С целью софинансирования проекта «Территория здоровья». Мы предлагаем помощь в реализации данного проекта в рамках инициативного бюджетирования инициативных проектов в городском округе - городе Барнауле в виде дополнительного финансирования. В случае получения проектом финансовых средств на реализацию из городского бюджета Финансовые средства в размере 10000 руб. гарантируем предоставить с расчетного счета № 40702810702000017971, к/с 30101810200000000604, БИК 040173604 в срок до 31.08.2026 г. банковским переводом на предоставленные реквизиты.

Руководитель

Кальченко М.В.



Общество с ограниченной ответственностью

Снежка

656050, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 73-46

ИНН\КПП 2223600647\222301001

8-906-940-8107

Руководителю инициативного проекта

«Территория здоровья»

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

№ 4 от 20.10.2025

г. Барнаул

С целью софинансирования проекта «Территория здоровья». Мы предлагаем помощь в реализации данного проекта в рамках инициативного бюджетирования инициативных проектов в городском округе-городе Барнауле в виде дополнительного финансирования. Финансовые средства в размере 10 000 рублей гарантируем предоставить с расчетного счета №40702810909650000710, к\с 30101810100000000850, БИК 045004850, на счет руководителя инициативного проекта «Территория здоровья» Золотаревой Ю.И., в случае получения проектом финансовых средств на реализацию из городского бюджета.

Директор _____ Ю.И. Золотарева





Гарантийное письмо

С целью софинансирования проекта мы предлагаем помощь в реализации данного проекта в рамках инициативного бюджетирования инициативных проектов в городском округе-городе Барнауле.

Настоящим гарантийным письмом удостоверяется, что

АНОПНС «Добро хорошо»

ФИО физического лица, наименование индивидуального предпринимателя/юридического лица).

Обязуется обеспечить трудовое участие группы физических лиц (10 и более), направленное на подготовку и выравнивание грунта, разгрузки и переноса устанавливаемого оборудования.

До 31.08.2026г. обязуется безвозмездно предоставить:

1. Неоплачиваемые работы:

№ п/п	Описание работ
1	Работы по подготовке и выравниванию грунта
2	Работы по уборке территории после проведения работ
3	Вынос строительного мусора, материалов
Итого	

А.А.Верещинская

(ФИО физлица, ИП/юр.лица)

подпись

20.10 2025г.

дата

